



EDIÇÃO ESPECIAL PEAC  
Projetos de compensação e estruturantes

# Informativo

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL REGIONAL DOS EMPREENDIMENTOS MARÍTIMOS DA PETROBRAS NA BACIA DE SERGIPE - ALAGOAS

A realização do Programa de Comunicação Social Regional é uma medida de mitigação exigida pelo Licenciamento Ambiental Federal, conduzido pelo IBAMA.



## Edição especial: Balanço dos projetos de compensação e estruturantes do PEAC

Esta edição especial traz um balanço geral da situação dos projetos de compensação e estruturantes do Programa de Educação Ambiental com Comunidades Costeiras - PEAC. Como se pode constatar, já se fez um percurso de muitas realizações e tem-se ainda o desafio de muitos projetos a iniciar.

Será possível neste Informativo compreender melhor todas as etapas envolvidas na implementação dos projetos, desde a seleção de demandas até a sua conclusão, passando pelas etapas de contratação da elaboração dos projetos e sua aprovação, contratação da execução e execução propriamente dita.

Como se sabe, existem projetos de compensação que consistem de capacitações técnicas, mas, de um modo geral, há várias ações de capacitação em todos os projetos, sejam eles projetos de reforma de embarcações, de veículos para transporte de pescados ou de artesanato, de tratores para uso na agricultura, de fábricas de polpas de fruta, de unidades de beneficiamento de pescados ou de centros comunitários.


Um balanço de tudo o que já foi realizado é apresentado em formato fotográfico, buscando-se retratar o conjunto dessas atividades e das pessoas envolvidas. São também apresentados os cronogramas atualmente previstos para a finalização de projetos em execução e realização de todos os demais projetos.



### Situação atual dos projetos de compensação

PROJETOS EM ANDAMENTO - CRONOGRAMA		2018												2019						
Tipologia	Comunidades e Descrição de atividades	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul		
<b>Comunidades com projetos prioritizados em 2016</b>																				
Construção	Construção de Centro Comunitário de Brejão dos Negros																			
Construção	Construção de Centro Comunitário de Piranhas																			
Construção	Construção de Centro Comunitário de Robalo/São José																			
Construção	Construção de sede da Associação de Ilha Mem de Sá																			
Construção	Construção de Centro Comunitário de Massadiço																			
Construção	Construção de Centro Comunitário de Tibúcio																			
Construção	Construção de Centro Comunitário de Pedra Furada																			
Construção	Construção de Centro Comunitário de Abadia																			
Construção	Construção de Centro Comunitário de Cachoeira																			
Construção	Construção da sede da Associação de Aracaré/Oitizeiro/Garatuba																			
Construção	Construção da sede da Associação de Capuã																			
Construção	Construção da sede da Associação de Ouricuri																			
Reforma	Reforma da sede da Associação de Atalaia Velha																			
Construção	Construção da sede da Colônia de Pescadores de Barra dos Coqueiros																			
Reforma	Reforma da sede da Colônia de Pescadores de Aracaju																			
Capacitação	Corte e Costura com Aquisição de Maquinário em Mosqueiro																			
Capacitação	Eletricista Industrial e Ajustador Mecânico em Nova Descoberta																			
Capacitação	Mecânica de Motor de Rabeta em Sede de Itaporanga D'Ajuda																			

Situação Atual dos Projetos do PCAP

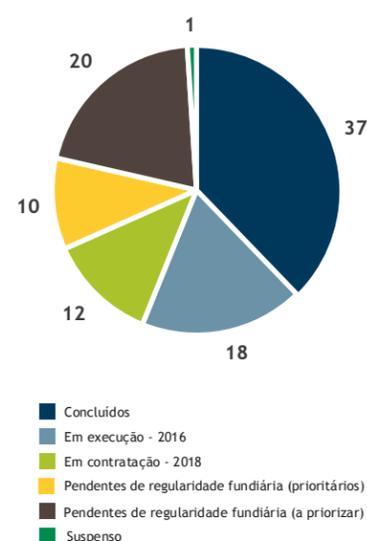

A elaboração e distribuição desta edição, por ocasião do X Encontro do PEAC, também decorre da consulta pública realizada pelo IBAMA para o TLD de Farfan, conforme estabelecido no Parecer Técnico nº 145/2017-COPROD/GMAC/DILIC.

# Projetos concluídos 2011 - 2012

**Brejo Grande, 2011.** Curso de Capacitação em Manutenção de Motor de Rabeta.



**Pirambu, 2011.** Mobiliário e equipamentos para a Colônia Z-5.



**Indiaroba, 2012.** Centro Regional Comunitário Sul, em Sete Brejos.



**Estância, 2012.** Barcos novos e reformados e palestra sobre manutenção de embarcações em Miranga e Miranguinha.



**Pacatuba, 2012.** Veículo para transporte de pescados em Ponta dos Mangues.



**Barra dos Coqueiros, 2012.** Curso de Artesanato em Pontal da Barra.



**Pirambu, 2012.** Maquinário, reforma de centro comunitário e curso de artesanato em Santa Isabel.



**Pirambu, 2012.** Capacitação em Eletricista e Instalador Hidráulico em Aguilhadas.



**São Cristóvão, 2012.** Curso de Informática Básica (2012) e Equipamentos de Informática (2017) na sede do município.



**Sítio do Conde, 2012.** Caminhão para o transporte de pescados.



**São Cristóvão, 2012.** Cursos de Capacitação em Eletricista Predial e de Instalador Hidráulico em Tinharé, Chica e Pedreira.



**Estância, 2012.** Barcos novos e reformados em Curimã, Gravatá e Muculanduba.



# Projetos concluídos 2013 - 2014

São Cristóvão, 2013. Reforma da sede da associação, sala com computadores e Capacitação em Informática Básica em Caipe Velho.



São Indioraba, 2013. Centro de Informática em Cajuerinho



Pacatuba, 2013 e 2018. Centro Regional Comunitário Norte, em Tigre.



Itaporanga D'Ajuda, 2013. Reforma e ampliação da sede da associação de moradores, com aquisição de máquina de estampa de roupa em Costa do Pau d'Arco



Indiaroba, 2013. Reforma do centro comunitário, com espaço adequado para salas de reunião e informática, em Preguiça.



Brejo Grande, 2013. Aquisição de trator com carroção, grade hidráulica, rotativa e plantadeira de arroz em Resina.



Indiaroba, 2013. Reforma do centro comunitário, com espaço adequado para salas de reunião e informática, em Saguim.



Brejo Grande, 2012 e 2013. Cursos de Ecoturismo e de Informática Básica e Avançada em Saramém.



Santa Luzia do Itanha, 2014. Centro Comunitário e Curso de Informática Básica em Cajazeiras.



Estância, 2014. Centro Comunitário e máquinas de costura em Farnaval.



Conde, 2014. Centro Comunitário e Curso de Informática Básica em Siribinha.



Santa Luzia do Itanha, 2014. Centro Comunitário em Taboa.



# Projetos concluídos 2014 - 2017

**Pacatuba, 2014.** Centro Comunitário e Curso de Informática Básica em Tigre.



**Itaporanga D'Ajuda, 2015.** Centro Comunitário e Curso de Informática Básica no Loteamento Lauro Rocha.



**Indiaroba, 2015.** Centro Comunitário e Curso de Informática Básica em Santa Teresinha.



**Indiaroba, 2015.** Reestruturação da fábrica de polpa de frutas e capacitações técnicas no Assentamento Sete Brejos.



**Pirambu, 2017.** Trator com implementos agrícolas e capacitações técnicas em Aningas.



**Pacatuba, 2017.** Sede da Associação e Curso de Informática Básica em Aracaré, Oitizeiro e Garatuba.



**Brejo Grande, 2017.** Centro Comunitário com infocentro e espaço destinado a corte e costura em Brejão dos Negro.



**Jandaíra, 2017.** Centro Comunitário e Curso de Informática Básica e de Corte e Costura em Cachoeira.



**São Cristóvão, 2017.** Reforma da Sede da Colônia de Pescadores Z-2.



**Santa Luzia do Itanha, 2017.** Reforma da Sede da Colônia de Pescadores Z-3.



**Indiaroba, 2017.** Reforma da Sede da Colônia de Pescadores Z-11.



**Coqueiro/Jandaíra, 2017.** Reforma da Sede da Colônia de Pescadores Z-66.



## BALANÇO FOTOGRÁFICO

# Projetos concluídos 2014 - 2017

**Pacatuba, 2017.** Veículo para o transporte de produtos locais e capacitações técnicas em Junça.



**Pacatuba, 2017.** Trator e implementos agrícolas em Tijupares e Maracujá.



**Jandaíra, 2017-2018.** Centro Comunitário e Curso de Informática Básica em Abadia.



**Pacatuba, 2017-2018.** Construção de Centro Comunitário e Curso de Informática Básica em Piranhas.



**Santa Luzia do Itanhê, 2017-2018.** Centro Comunitário em Pedra Furada.



**Barra dos Coqueiros, 2017-2018.** Construção da sede da Colônia de Pescadores Z-13.



**Itaporanga D'Ajuda, 2018.** Cursos de Eletricista Industrial e Ajustador Mecânico em Nova Descoberta.



**Itaporanga D'Ajuda, 2017-2019.** Curso de Mecânica de Motor de Rabeta.



**Estância, 2017-2018.** Construção de Centro Comunitário em Massadiço.



## BALANÇO FOTOGRÁFICO

# Projetos em execução

## 2018 - 2019

**Barra dos Coqueiros, 2017-2018.** Construção da sede da Associação de Catadores e Catadoras de Mangaba.



**Aracaju, 2018.** Construção de Centro Comunitário em Robalo e São José.



**Aracaju, 2018.** Reforma da sede da Associação de Pescadores da Atalaia Velha.



**Aracaju, 2017-2018.** Oficina de corte costura, bordado, crochê e pintura em tecido com aquisição de maquinário (ao fundo) no Mosqueiro.



**Estância, 2017-2018.** Construção de uma sede para a Associação de Moradores em Ouricuri.



**Estância, 2017-2018.** Construção de Centro Comunitário em Tibúrcio.



# Quais são os desafios encontrados para a execução dos projetos de compensação e estruturantes?

DESAFIOS	EXEMPLOS
Fragilidade na organização das comunidades, com implicações na mobilização e efetiva participação.	Inexistência de associações formalizadas e organizadas para a discussão, recebimento e gestão dos projetos de compensação (necessidade de mobilização para constituição e efetivação de associações).
Dificuldades legais para a implementação dos projetos de compensação (regularidade fiscal, tributária e fundiária das comunidades).	<b>Regularidade fiscal e tributária:</b> A grande maioria das associações tem algum tipo de pendência de regularização constitutiva e fiscal (falta de eleições, falta de atas formalizando-as, estatuto irregular, inadimplência com a Previdência e com a Receita Federal). <b>Regularidade fundiária:</b> A maioria dos projetos envolve necessidade de terreno e de regularização jurídica, com prazos que não comportam uma previsibilidade segura (efetivação de processos de doação pública e privada, liberações junto ao SPU, processos de usucapião).
Contratação de equipes qualificadas para a elaboração de projetos de compensação (multiplicidade de demandas, exigindo competências específicas).	Dificuldade de encontrar empresas qualificadas para elaboração de todos os projetos (nem sempre se conseguiu uma resposta adequada do mercado para a diversidade de projetos envolvida - fábricas de polpa de fruta, fábrica de sabão, unidade de beneficiamento de pescado, unidade de beneficiamento de fibra de coco, entre outros; deficiências nos projetos implicam em revisões e adequações que provocam descumprimento de prazos).
Viabilidade ambiental de projetos.	Alguns projetos, depois de prontos, foram considerados ambientalmente inviáveis pelo IBAMA (projetos de piscicultura em tanque-rede em comunidades próximas à Rebio de Santa Izabel).
Viabilidade técnica e socioeconômica de projetos.	Alguns projetos foram avaliados como inviáveis do ponto de vista técnico e econômico (fábrica de sabão em Santa dos Frades), social e econômico (processamento de fibra de coco em Lagoa Redonda) e social (cooperativa de agricultura familiar em Tijupares e Maracujá).
Regularidade com relação às exigências de convênios já celebrados.	Algumas associações apresentam dificuldades para fazer uma gestão adequada e prestação de contas dos recursos disponibilizados para a efetivação dos projetos.
Doações de terreno.	Os processos de doação pelo poder público exigem a aprovação de lei específica, além da disponibilidade de terrenos próximos das comunidades e que tenham regularidade fundiária. Processos envolvendo a doação privada têm sido demorados quando envolvem questões de regularidade fundiária e, em alguns casos, ocorreram desistências ou impossibilidades legais para a efetivação das doações.
Modelo de instrumento contratual para execução dos projetos.	A segurança jurídica necessária para a implementação dos projetos exige que a Petrobras seja rigorosa no atendimento de todos os requisitos para contratação, não havendo margens para flexibilização. A celebração de convênios possibilitou a execução de vários projetos, porém, em razão da requerida segurança jurídica, esse modelo não mais poderá ser adotado.

# Quais as etapas e prazos envolvidos na execução de um projeto, quando realizado pela Petrobras?

Reunião de priorização de demandas nas comunidades	1 MÊS
Avaliação das demandas pelo IBAMA	
Processo de contratação do Projeto Executivo	3 MESES
Elaboração do Projeto Executivo	
Reunião devolutiva	3 MESES
Encaminhar Projeto Executivo ao IBAMA	
Aprovação do IBAMA	2 MESES
Processo de contratação de execução do projeto	9 MESES
Execução do Projeto	ENTRE 5 E 12 MESES <sup>1</sup>
Encaminhar relatório final ao IBAMA	
Avaliação do relatório final pelo IBAMA	1 MÊS

<sup>1</sup>O prazo de execução depende do tipo de projeto. Projetos que envolvem reformas ou construções requerem em média 12 meses. Projetos que envolvem cursos ou aquisição de bens podem ser realizados entre 5 e 7 meses.

**TOTAL DE 24 A 31 MESES**



O cronograma abaixo refere-se aos projetos com pendências fundiárias que foram priorizados pelo Conselho Gestor do PEAC. Para estes, foi realizado, por demanda do IBAMA, um Estudo de Viabilidade de aquisição de terreno/imóvel nas localidades envolvidas e esse estudo encontra-se em revisão (até maio de 2018) pois o IBAMA considerou que a primeira versão apresentada pela Petrobras não foi conclusiva com relação à real viabilidade de aquisição.

Paralelamente, continuam valendo os esforços de obtenção de terrenos via cessão de uso ou doação, com maior probabilidade de sucesso nos casos que dependem da SPU ou de instituições como o DER/SE.

Como não é viável para a Petrobras iniciar os dez projetos ao mesmo tempo, eles foram organizados em dois blocos, com as ações de campo do segundo bloco começando três meses depois do primeiro.

		PROJETOS PRIORITÁRIOS (CONSELHO GESTOR) - CRONOGRAMA																																															
Tipologia	Comunidades e Descrição de atividades	2018												2019												2020												2021											
		mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez		
Arranjo Produtivo e Centros Comunitários	<b>Comunidades com projetos com pendências fundiárias</b>																																																
	Carapitanga, Z-16 (Brejo Grande), Canal e Touro, Terra Caída, Barra de Itariri																																																
	Revisão do estudo da viabilidade de compra dos terrenos																																																
	Apresentar à comunidade as opções de terreno e confirmar interesse em ter o projeto executado em um desses terrenos.																																																
	Aquisição do terreno																																																
	Processo de Contratação do Projeto Executivo																																																
	Elaboração do Projeto Executivo																																																
	Reunião Devolutiva																																																
	Encaminhar Projeto Executivo ao Ibama																																																
	Aprovação do Ibama																																																
	Processo de Contratação da Execução do Projeto																																																
	Execução do Projeto																																																
Construção	<b>Boca da Barra, Praia do Saco, Porto do Mato, Abaís, Pontal</b>																																																
	Revisão do estudo da viabilidade de compra dos terrenos																																																
	Apresentar à comunidade as opções de terreno e confirmar interesse em ter o projeto executado em um desses terrenos.																																																
	Aquisição do terreno																																																
	Processo de Contratação do Projeto Executivo																																																
	Elaboração do Projeto Executivo																																																
	Reunião Devolutiva																																																
	Encaminhar Projeto Executivo ao Ibama																																																
	Aprovação do Ibama																																																
	Processo de Contratação da Execução do Projeto																																																
	Execução do Projeto																																																
	Encaminhar Relatório Final ao Ibama																																																
Avaliação do Relatório Final pelo Ibama																																																	

Para os vinte projetos cuja execução ainda não foi priorizada é apresentado o cronograma abaixo. No momento, ainda não é possível apresentar um cronograma mais preciso em termos de data de início, porém é certo que não é factível que todos sejam iniciados ao mesmo tempo. O cronograma prevê que as ações de campo desses projetos sejam iniciadas a partir de dezembro de 2018, contudo haverá necessidade de priorização por blocos definindo-se, por exemplo, os cinco primeiros projetos a serem iniciados e mais três blocos consecutivos,

pactuando-se a defasagem entre eles. Tal priorização envolve o IBAMA e o Conselho Gestor do PEAC. Uma regra que tem sido usada para priorização é a de que projetos cujas pendências fundiárias sejam resolvidas, automaticamente são priorizados.

Além desses vinte, há uma situação que aguarda definição do IBAMA, que é a reforma de Colônia de Pescadores Z-31 (Conde, na Bahia).

		DEMAIS PROJETOS - CRONOGRAMA																																															
Tipologia	Comunidades e Descrição de atividades	2018												2019												2020												2021											
		mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez		
Arranjo Produtivo e Centros Comunitários	<b>Comunidades com projetos com pendências fundiárias</b>																																																
	Sede de Pirambu, Sede da Barra dos Coqueiros, Coroa do Meio, Areia Branca, Bairro Industrial, Apicum, Rita Cacete, Arame I, Arame II, Paruí, Água Boa, Z-4- Estância, Castro, Sede de Santa Luzia do Itanhí, Mangue Seco, Costa Azul																																																
	Reunião de redefinição da demanda na comunidade																																																
	Estudo da viabilidade de terrenos																																																
	Apresentar à comunidade as opções de terreno e confirmar interesse em ter o projeto executado em um desses terrenos.																																																
	Aquisição do terreno																																																
	Processo de Contratação do Projeto Executivo																																																
	Elaboração do Projeto Executivo																																																
	Reunião Devolutiva																																																
	Encaminhar Projeto Executivo ao Ibama																																																
	Aprovação do Ibama																																																
	Processo de Contratação da Execução do Projeto																																																
Construção	<b>Lagoa Redonda, Olhos D'Água, Jatobá, Carmo e Coqueiro</b>																																																
	Reunião de redefinição da demanda na comunidade																																																
	Avaliação e aprovação da demanda pelo IBAMA																																																
	Processo de Contratação do Projeto Executivo																																																
	Elaboração do Projeto Executivo																																																
	Reunião Devolutiva																																																
	Encaminhar Projeto Executivo ao Ibama																																																
	Aprovação do Ibama																																																
	Processo de Contratação da Execução do Projeto																																																
	Execução do Projeto																																																
	Encaminhar Relatório Final ao Ibama																																																
	Avaliação do Relatório Final pelo Ibama																																																
Arranjo Produtivo	<b>Z-31 -Conde</b>																																																
	Projeto suspenso, aguarda definição do IBAMA																																																

O informativo dos empreendimentos marítimos da Petrobras na Bacia de Sergipe - Alagoas é uma publicação do Programa de Comunicação Social Regional (PCSR), medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Petrobras - Unidade de Operações de Exploração e Produção de Sergipe e Alagoas.  
Responsável pela publicação: Ricardo Leal Costa Santos, CONRERP 309 - 7ª Região

Rua Acre, 2504, Bloco F, Bairro América, Aracaju/SE, CEP 49.080-010  
(79) 3212-2228 - launseal@petrobras.com.br - Tiragem: 600 exemplares
